



आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन




कुमाख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रागेचौर, सल्यान
मिति २०८३/०५/०९ गते

website: www.kumakhmalikamun.gov.np, Email: ito.kumakh2073@gmail.com 📞 9857844801



कुमाख गाउँपालिका केन्द्र, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुको नक्सा र जनसंख्याको विवरण



Legend

कुमाख गाउँपालिका र वडाहरु

कुमाख गाउँपालिका स्वास्थ्य


2,400

Total HH

Total Population

Male

Female

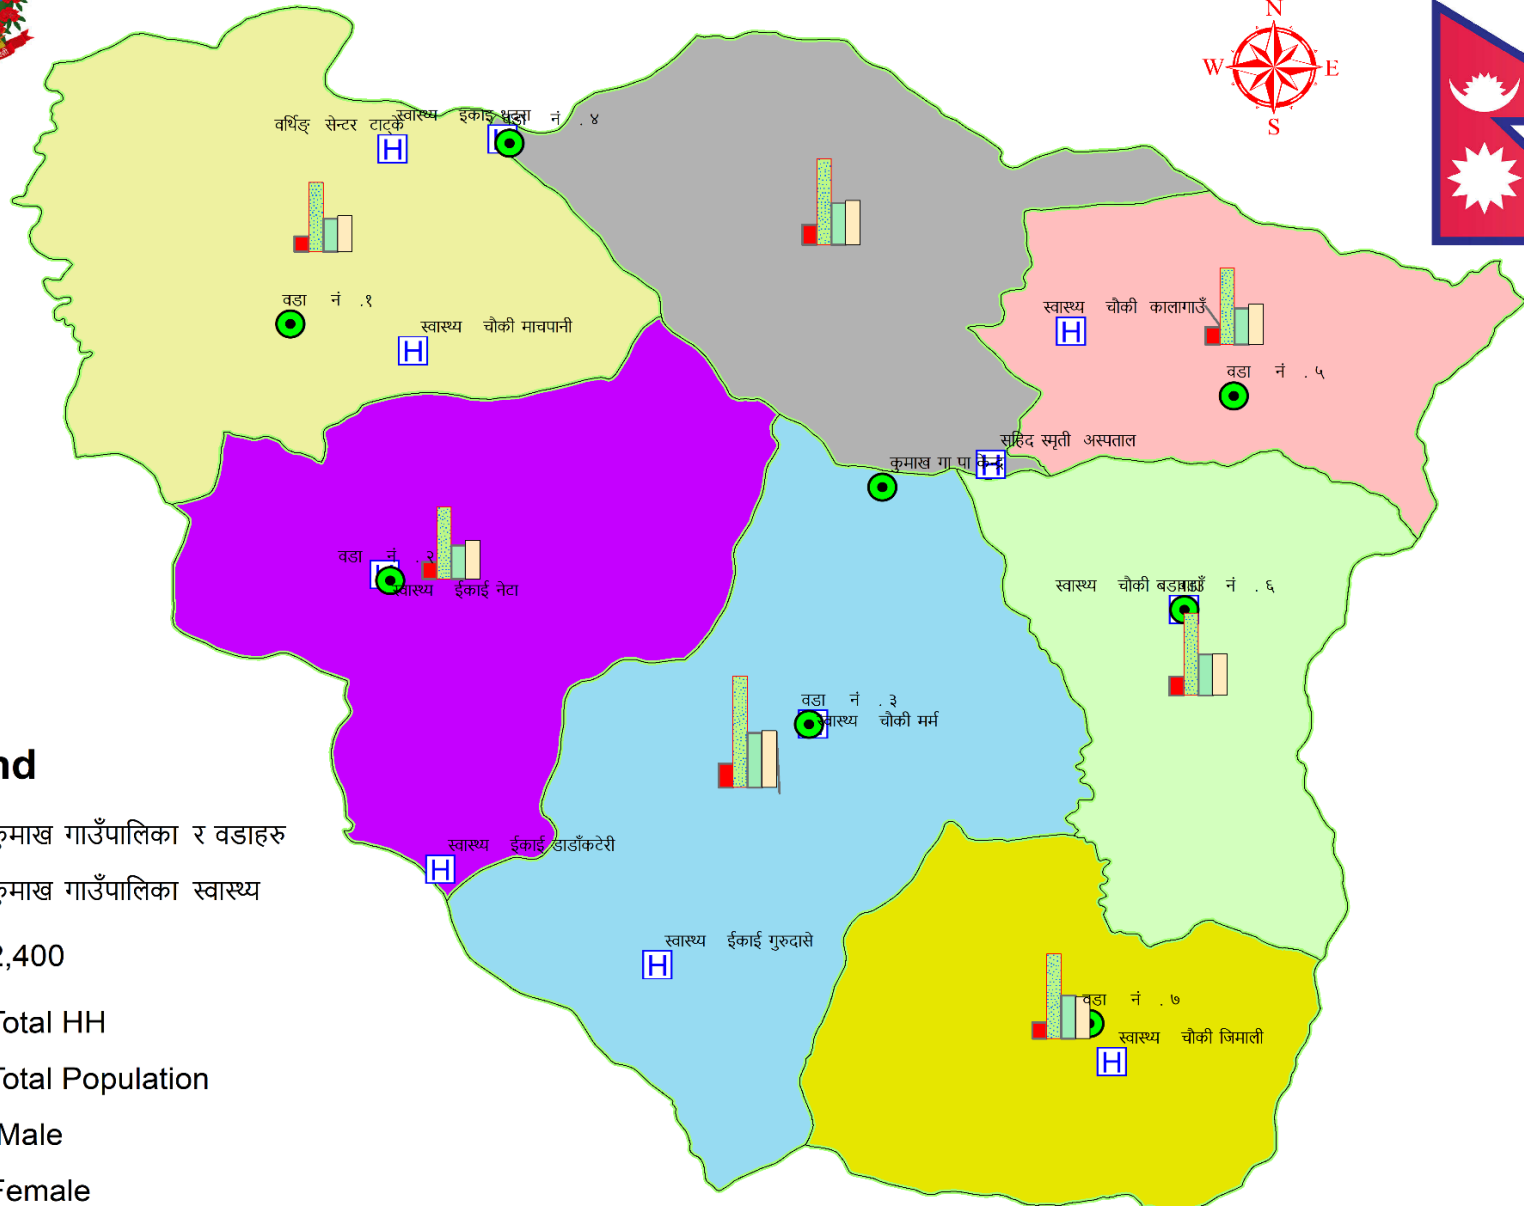

0 1.25 2.5 5 Kilometers

Data Source: National Census 2078



कुमाख गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय:

- गाउँपालिकाको नाम: कुमाख
- गाउँपालिका घोषणा मिति: २०७३/११/२७
- प्रदेश: कर्णाली
- देशान्तर: २८° ५६'४३" पुर्वी देशान्तर
- अक्षांश: २८°४१'०३" उत्तरी आक्षांश
- साविकका गाविस: कालागाउँ, वडागाउँ, जिमाली, मर्मपरिकाँडा र स्वीकोट
- वडा संख्या: ७
- कुल क्षेत्रफल: १७७.२७ वर्गमिटर
- उचाइ: ४५० मि. – २५३७ मि.,
- कुल जनसंख्या: २४,८५९
- जम्मा घरधुरी: ५,४९९
- महिलाको जनसंख्या: १२,७६५ (५१.३६ %)
- पुरुषको जनसंख्या: १२,०९४ (४८.६४ %)
- विद्यालय संख्या: ५२ (मा.वि.-१०, आधारभुत: ३५ संस्थागत: ३, बा.वि.के: २, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र: २)
- स्वास्थ्य संस्था: ५७ (स्वास्थ्यचौकी: १२, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई: ४, आधारभुत स्वास्थ्यसेवा केन्द्र: २, आधारभूत अस्पताल: १, खोप क्लिनिक: २३, गाउँघर क्लिनिक: १५)
- सीमा क्षेत्र
- पूर्व: दार्मा गा.पा., बागचौर न.पा.
- पश्चिम: बनगाड कुपिण्डे न.पा.
- उत्तर: रुकुम पश्चिम, जाजरकोट
- दक्षिण: सिद्ध कुमाख गा.पा.
- वन क्षेत्र: १०,४०८ वर्ग मिटर
- प्रमुख पर्यटकीय स्थल: कुमाख लेक, सिद्ध बाबाको मन्दिर, सिद्ध गुफा



दरबन्दी तेरिज अनुसार गा.पा. र वडाहरूमा दरबन्दी विवरण :



तह	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त	कैफियत
		स्थायी	करार	जम्मा		
अधिकृतस्तर	७	७	०	७	०	
सहायकस्तर	२६+१	२१+१	२	२३+१	५	
तहविहिन	०	१	०	१	०	
कुल जम्मा	३४	२३	२	३२	५	



दरबन्दी तेरिज अनुसार कृषि तथा पशु बिकास शाखा तर्फ कर्मचारीको विवरण :



तह	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति संख्या			रिक्त	कैफियत
		स्थायी	करार	जम्मा		
अधिकृतस्तर	२	२	०	२	०	
सहायकस्तर	७	५	०	५	२	
तहविहिन	०	०	०	०	०	
कुल जम्मा	९	७	०	७	२	



गाउँपालिका र वडा तर्फका सबै सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको संख्यात्मक विवरण



तह	विवरण			कैफियत
	स्थायी	करार	जम्मा	
अधिकृतस्तर	१२	०४	१६	
सहायकस्तर	२२	१३	३५	
तहविहिन	१	१५	१६	
कुल जम्मा	३५	३२	६७	



आ.व. २०८२/०८३ को भौतिक प्रगति



क्र.स	क्षेत्र	स्वीकृत योजना	सम्पन्न/क्रमागत योजनाहरु
१.	सडक	३६	३६
२.	भवन, मन्दिर, प्रतिक्शालय, घेरबार आदि	३३	३३
३.	खानेपानी	२३	२३
४.	सिंचाई कुला ,पोखरी ,तटबन्धन	२६	२६
५.	पुल पुलेसा	१	१
	जम्मा	११९	११९

सडक प्रगति (ठेक्का/कोटेसन अन्तर्गत)

- * सडक लम्बाई : १३,००० मि (१३ कि.मि)
- * ग्याबिन कार्य : १३६ घन मिटर
- * सोलिङ्ग : १.२२ कि.मि
- * ह्युम पाइप : २३ मि



आ.व. २०८२/०८३ को वित्तीय प्रगति



विवरण	विनियोजनका आधारमा खर्च प्रतिशत
चालु	८३.३६ %
पूँजीगत	५३.१८ %
जम्मा	७४.९५ %



आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को क्षेत्रगत बजेट खर्च विवरण

क्र.सं	क्षेत्र/उपक्षेत्र	विनियोजन (रु.)	खर्च (रु.)	खर्च (%)	मौज्दात (रु.)
१.	आर्थिक विकास	२,७४,५३,०००.००	१,९३,५९,१७८.०	७०.५२	८०,९३,८२२.००
२.	सामाजिक विकास	२६,३०,९४,०००.००	२१,१५,७९,६४६.२४	८०.४२	५,१५,१४,३५३.८०
३.	पूर्वाधार विकास	८,०४,१९,०००.००	४,२२,४१,४०२.००	५२.५३	३,८१,७७,५९८.००
४.	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	२,०९,३०,०००.००	१,२२,०४,८३९.५०	५८.३१	८७,२५,१६०.५०
५.	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र	१२,४०,८०,६२१.५२	१०,१३,३३,३६१.३८	८१.६७	२,२७,४७,२६०.१०
	कुल जम्मा	५१,५९,७६,६२१.५२	३८,६७,१८,४२७.१२	७४.९५	१२,९२,५८,१९४.४०



आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का संकलित जम्मा राजश्व

क्र.सं.	विवरण	संकलित राजश्व रकम(रु.)	कैफियत
१	गाउँपालिका आन्तरिक राजश्व	२९,५७,८१२.२१ ।-	
२	गाउँपालिका विभाज्य कोष	२७,४८,८००.०० ।-	
३	१ नं वडा कार्यालय	८७,६१९.३१ ।-	
४	२ नं वडा कार्यालय	४,६०,७५१.०० ।-	
५	३ नं वडा कार्यालय	४,५७,१४४.८६ ।-	
६	४ नं वडा कार्यालय	२,९४,८२६.४६ ।-	
७	५ नं वडा कार्यालय	२,५२,२१३.९३ ।-	
८	६ नं वडा कार्यालय	२,०४,०७३.५७ ।-	
९	७ नं वडा कार्यालय	२,३०,७८२.९९ ।-	
	जम्मा संकलित राजश्व रु.	७६,९४,०२४.३३ ।-	



आ.व.२०८२/०८३ मा संचालित आयोजनाहरुको पालिका/वडागत विवरण (अन्य कार्यक्रम बाहेक) :



क्र.सं	वडा नं.	सम्झौता भएका योजना संख्या	भुक्तानी भएका योजना संख्या	कार्य सम्पन्न नभएका	कैफियत
१.	१	१३	१३		
२.	२	७	७		
३.	३	२१	२१	१	इस्टिमेट बमोजिम कार्य नभई भुक्तानी नभएको
४.	४	११	११		
५.	५	१२	१२		
६.	६	८	८		
७.	७	११	८		
८.	गा.पा. ठेक्काहरु	१३	८	५	४ रनिङ्ग बिल भुक्तानी र १ थदरा विद्यालयको कार्य प्रगती नभएको
९.	सिल कोटेसन	६	५	१	क्रमागत वडा नम्बर ६ का सडक निर्माण
	जम्मा	१०२	९३	६	नोट: योजना शाखामा सम्झौता भई भुक्तानी भएका मात्र



आ.व.२०८२/०८३ मा संचालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको आधारमा :



क्र.सं	विवरण	आयोजना संख्या
१.	उपभोक्ता समिति मार्फत	८३
२.	निर्माण व्यवसायी मार्फत	१९ (ठेक्का र कोटेसन)
३.	गैर-सरकारी संस्था मार्फत	१४ (रोजगार र सुस्वा)
४.	अन्य केही भए खुलाउने: (क) साना सिचाई-१० (ख) सडक मर्मत-७	१७
	जम्मा	१३३



आ.व.२०८२/०८३ मा संचालित आयोजनाहरुको बजेट कार्यान्वयनको आधारमा :



क्र.सं	विवरण	आयोजना संख्या
१.	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	५
२.	२० लाख देखि ५० लाख सम्मको आयोजना	६
३.	५ लाख देखि २० लाख सम्मको बजेटको आयोजना	$११+५+८=२४$
४.	१ लाख देखि ५ लाख सम्मको बजेटको आयोजना	$६४+१+१०=७५$
५.	१ लाख भन्दा कम बजेटको आयोजना	१३
	मर्मत सम्भार बाहेक	१२३



आ.व.२०८२/०८३ मा संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन तह/क्षेत्रको आधारमा :



क्र.सं	विवरण	योजना संख्या
१.	गा.पा. स्तरीय	१९ (ठेक्का र कोटेसन समेत)
२.	वडा स्तरीय	८३
३.	जम्मा	१०२ (अन्य बाहेक)



बोलपत्र मार्फत भएका योजनाहरू:



क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	निर्माण व्यवसायी/ फर्म	ठेक्का नं	सम्झौता रकम (रु.)	भौतिक प्रगति	कैफियत
१.	सिस्नेरी देखि गाउँपालिका क्षेत्रतिर खानेपानी आयोजना	बि एण्ड बि विल्डर्स	KRM-NCB-W-08-2082-083	५०१३४८८.९४	५.९४%	संघ-विशेष
२.	जलजले खानेपानी योजना	चक्र रिता निर्माण सेवा	KRM-NCB-W-03-2082-083	१७८७३२७.००	७९.७४%	प्र.विशेष
३.	Construction of Gaupalika hudai Thati samma sadak nirman,khaple magar tol sadak nirman, Gurudase lamidanda timile sadak nirman, katyakhola dekhio daratol sadak nirman,damare rataghar har bhur sadak nirman , Seripata hile sadak nirman ,Falneta dekhi ikhra gaun samma sadak starunnati, Khakreneti seripata varne sadak nirman ward 3	डायनमिक कुमाख निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स	KRM-NCB-W-01-2082-083	२६१४३९७.५९	९०.९%	गा.पा.
४.	खारखोला सिस्नेकोट खानेपानी आयोजना	गोपाल निर्माण सेवा	KRM-NCB-W-04-2082-083	३८५८०००.४१	२२.११%	प्र.विशेष
५.	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई टाट्केचौर भवन निर्माण कुमाख	सफल निर्माण सेवा	KRM-NCB-W-02-2082-083	६१७३७९८.५८	५३.०६%	प्र.समपुरक



क्रमशः



क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	निर्माण व्यवसायी/ फर्म	ठेक्का नं	सम्झौता रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
६.	Construction of Neta dekhi dandakateri sadak Staroannati ward no.2, Kharkhola Shantibajar sadak nirman ward no.2 ,Kaule kicha khola sadak nirman ward no.2, Balkalyan aabi field nirman ward no.2, Simkhet Gaunpaika sadak nirman Ward no.2	जेनिसा कन्स्ट्रक्सन	KRM-NCB-W-06-082-083	२३,४८,९३८.७१	९०.५३%	गा.पा
७.	Construction and Upgrading of different road project in Kumakh Rural Municipality Ward no.5, Salyan	डायनमिक कुमाख निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स	KRM-NCB-W-05-2082-083	३२,५४,००२.७१	९०.९३%	गा.पा
८.	Construction Of Mahendra Mabi Dekhi Prakritik Aabi Turture Sadak Staronnati Ward no. 7, Ghodabanne Dekhi Chayaukhola samma Sadak Nirman, Kasari Khola Dekhi Sanipathihalna Samma Sadak Staronnati Ward no 7, Bheri Khola Dekhi Kotnaula Hudai Ramri Samma Sadak Starounnati Ward no 7, Milghar Dekhi Amarpalaya Samma Sadak Staronnati, Simaldada dekhi Chahare Khola Simatare samma Sadak	जेनिसा कन्स्ट्रक्सन	KRM-NCB-W-07-082-083	२२,३७,६७८.५४	९०.७%	गा.पा



क्रमशः



क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	निर्माण व्यवसायी/ फर्म	ठेक्का नं	सम्झौता रकम (रु.)	भौतिक प्रगति	कैफियत
९.	Construction of Marma Khola Foot Cum Small Vehicle Bridge, Kumakh 1 & 4 Jodne Pul, Salyan	देव कन्ट्रक्सन	KRM-NCB-W-08-2081/082	१,१४,६८,३५४.८६	६५.३३%	गा.पा.
१०	श्री कालिका आ.वि. सेरागाउँ भवन निर्माण, कुमाख-६	डायनमिक कुमाख निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स	KRM-NCB-W-06-2081/082	६५,३६,९५०.५	८०%	-
११	श्री प्रचलित स्मृति आ.वि. खोरेखोला भवन निर्माण, कुमाख-५	डायनमिक कुमाख निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स	KRM-NCB-W-06-2081/082	६६,५५,९२९.९९	८८.४१%	
१२	श्री जनजागृति आ.वि.थदरामा भवन निर्माण, कुमाख-४	गोपाल निर्माण सेवा	KRM-NCB-W-04-2081/082	३१,४५,३७६.३३	९०%	
१३	पालिका घेरवार तथा गार्डेन निर्माण	जेनिसा कन्ट्रक्सन	KRM-NCB-W-02-2081/082	३८,४५,२४९.०९	९१.३०%	



कोटेशन मार्फत भएका योजनाहरू



क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	निर्माण व्यवसायी/ फर्म	स्वीकृत कोटेशन रकम	विनियोजित रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	श्री आ.वि विर्केनेटी भवन फिनिसिङ	वि एण्ड वि विल्डर्स	१००४२४६.४७	१०५००००	९४.५२%	गा.पा
२	टिकाचौर सिंचाई कुलो निर्माण	किशान विल्डर्स	१११५७८३.५४	१५०००००	८९%	प्र.सशर्त
३	घोगर खेत तटबन्धन तथा बाँध निर्माण	जनक कन्स्ट्रक्सन सेवा	९००६६६.५०	१५०००००	९७.२७%	प्र.सशर्त
४	नेटा देखि बाल्ले डाँडा सम्म सडक निर्माण	ओम गौरव निर्माण सेवा	१७१९७६.७६	२०००००	९५%	गा.पा.
५	Purana gaau dekhi bikram khola samma sadak marmat, route dekhi darmali gaau samma sadak nirman,bhandar khola khelkud maidan nirman,pul dekhi khili bazar samma sadak nirman,bajumat dekhi khilobazar samma sadak marmat ward no 4	जेनिशा कन्स्ट्रक्सन	१०८२८४४.३०	१३०००००	९१.८४%	गा.पा
६	नुवागाउँ देखि पाउकोट सम्म सडक निर्माण र कालिमाटी देखि कोप्ची हुँदै टागे साधनमुढाचौर सम्म सडक निर्माण	जनक कन्स्ट्रक्सन सेवा	४३१२२३.११	५५००००	९०%	



मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजनाको विवरण



क्र.स .	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजित बजेट (रु.)	खर्च बजेट (सामग्री रु.)	खर्च बजेट (ज्याला रु.)	औसत रोजगारी (दिन)	कैफियत
१	लिउरेखोला पुछारदेखि टिकाचौर सम्म तटबन्धन आयोजना	४	१५,००,०००	५,७२,२१९	८,५९,२९३	४३.८३	
२	नेटा बजार मालिका मन्दिर पर्यटन मार्ग निर्माण	२	१५,००,०००	५,३१,९४८	९,२३,०५२	४८.९६	
३	त्वाल्दारी सिंचाई पोखरी निर्माण	५	१५,००,०००	५,९६,१५०	८,५८,८५०	४९.५२	
४	मिलनचोक एक घर एक धारा	१	१५,००,०००	५,८४,५८०	५,८५,२८३	३०.०२	
५	स्यानिजिमाली दलित बस्ती खानेपानी निर्माण	७	१५,००,०००	६,१८,८१२	६,२०,३९८	४८.४	
	जम्मा रु.		७५,००,०००	२९,०३,७०९	३८,४६,८७६	४४.१५	



राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजनाको विवरण



क्र. स	योजनाको नाम	वडा नं	विनियोजित बजेट रु.	खर्च बजेट (सामाग्री रु.)	खर्च बजेट (ज्याला रु.)	औसत रोजगारी (दिन)	कैफियत
१	नेटा ठुलाखोला सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति	५	९,०६,२८४	४,५३,१४२	४,५३,१४२	५४.६३	
२	ढारैखोला उकालोमा स्ल्याब तथा सडक निर्माण	१	९,०६,२८४	४,३९,५४८	४,५३,१४२	५४.६३	
३	बाल्ले देखि ढुंगेपानी सम्म सडक मर्मत योजना	५	९,०६,२८४	४,२०,९९७	४,५३,१४२	४०.०६	
	जम्मा		२७,१८,८५२	१३,१३,६८७	१३,५९,४२६	५०	



आ.व. २०८२/०८३ मा संचालित सुस्वा परियोजना अन्तर्गत खानेपानी मर्मत सम्भार योजनाहरुको विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस योजनामा उपभोक्ताको खर्च	घरधुरी	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
१.	दानलोटे देखि बराडाँडा हुँदै टाटा सम्म	३	१३,४०,०००	१३,१०,४०३	८,७०,०००	३५	१६५
२.	गेरुखोला A	५	७,१४,०००	७,०९,८४०	३,५७,०००	२७	१३२
३.	टाट्के	१	४,५०,०००	३,७५,५४१	२,२५,०००	१२६	६५६
४.	नैनथला लिफ्ट	१	८,४०,०००	७,११,६७०	४,२०,०००	७३	३९०
	जम्मा रु.		३३,४४,०००	३१,०७,४५४	१६,७२,०००	२६१	१,३४३



यस आ.व.२०८२/०८३ मा संचालित सुस्वा परियोजना अन्तर्गत खानेपानी मर्मत सम्भार योजनाहरुको विवरण



क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	योजनाको अनुमानित लागत (रु. मा)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	योजनामा गाउँपालिका को खर्च	लाभान्वित शिक्षक विद्यार्थी जनसंख्या
१.	महेन्द्र मा.वि कुमाख ७	७	९,८६,४३९	९,२०,९८०	१,९३,९८०	४२९
२.	जनता मा.वि कुमाख ३	३	९,२८,५३९	९,१८,८२८	१,८८,६९८	५५३
	जम्मा		१९,१४,९७८	१८,३९,८०८	३,८२,६७८	९८२



लक्षितवर्ग अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमको संख्या:

महिला संग सम्बन्धित- ८ वटा

अपाङ्ग संग सम्बन्धित-७ वटा

खेलकुद संग सम्बन्धित-७ वटा

जनजाती संग सम्बन्धित-६ वटा

अन्य-१२ वटा



जम्मा – ४० वटा



संघीय, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम र गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी रकम :



बजेट शीर्षक	अनुमानित बजेट	वास्तविक बजेट रु.	खर्च रकम रु.	खर्च (प्रतिशत)	कैफियत
संघीय सरकार तर्फ					
समानीकरण अनुदान	९,७३,००,०००	८,८९,८०,८५०	६७९४४९१७.६०	६९.८३	
शसर्त अनुदान चालु	२०,८६,१८,०००	२०,७४,६७,९९९	२०,८६,१८,०००.०	१००	
शसर्त अनुदान पुँजीगत	६०,००,०००	६०,००,०००	२९,५५,७२६.००	४९.२६	
विशेष अनुदान पुँजीगत	७२,००,०००	८,७०,०००	८,७०,०००.००	१००	
समपुरक अनुदान पुँजीगत	५२,००,०००	००	००	६९.८३	
प्रदेश सरकार तर्फ					
समानीकरण अनुदान	१,२४,१८,०००	१,२४,१८,०००	१०१७८८५३.००	८१.९७	
शसर्त अनुदान चालु	१३,६५,०००	१२,८५,०००	१२,८५,०००.००	९४.१४	
शसर्त अनुदान पुँजीगत	१,६५,००,०००	८९,७१,६५६.५०	८९,७१,६५६.५०	५४.३७	
विशेष अनुदान चालु	८५,००,०००	२३,४५,३२२	२२,९३,८९९.००	२६.९९	
समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,२०,००,०००	२३,८०,९६६	२३,८०,९६६.००	१९.८४	



(क्रमशः)



बजेट शीर्षक	अनुमानित बजेट रु.	वास्तविक बजेट रु.	खर्च रकम रु.	खर्च (प्रतिशत)	कैफियत
राजस्व बाँडफाँड (संघ)	९,९७,१४,५४५	९,७९,४९,८३५.२७	८,१९,४८,८४८.००	८२.१८%	
राजस्व बाँडफाँड (प्रदेश)	१९,०२,०००	१४,१५,०३५.७८	०	०	
राजस्व बाँडफाँड (स्थानीय)	३०,००,०००	३३,९६,३६७.४०	१०,१३,९८१.००	३३.८०%	
आन्तरिक श्रोत					
आन्तरिक श्रोत	३,५८,०९,०७६	४९,४५,२२४.३३	२,४९,०३,२७८.००	६९.५४%	
जम्मा रु.	५१,५५,२६,६२१.५२	४३,८४,२६,२५६.२८	३८,६७,३४,७२०.१२	७४.९५%	



आ.व.२०८१/०८२ सम्मको बेरुजु अद्यावधिक विवरणः

लेखा परीक्षण रकम (रु.)	जम्मा बेरुजु (रु.)	गत वर्षको अद्यावधिक रु.	सम्परी क्षण	अद्यावधिक बेरुजु (रु.)	लेखापरीक्षण अङ्कमा बेरुजु (प्रतिशत)	कैफि.
१,१७,६१,०५,०००	१,०६,१७,६५३	१४,७५,९५,९८८	०	१५,८२,१३,६४१	०.९०	

बेरुजु वर्गीकरण

असुल उपर गर्नुपर्ने	अनियमित	प्रमाण पेश नगरेको	पेशकी
रु.३,४९,६९,०४३	रु.६०,२६,६०६	रु.४५,३५,३४७	०

बेरुजु फछ्यौटको अवस्था

गत आ.व.२०८१/०८२ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा फछ्यौट भएको र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सम्परीक्षण कार्य अगाडी बढेको ।



सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था:



- ✓ SuTRA, PAMS, Planning Management System, Revenue, IEMIS, HMIS, Online Sifaris System लगायतका डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह ।
- ✓ गाउँपालिकाको वेबसाइट तथा फेसबुक पेजमार्फत सूचना तथा जानकारी प्रवाह ।
- ✓ स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (LGPAS) सम्बन्धी प्राप्त भएका विवरण तयार तथा प्रवृष्टीको कार्य सम्पन्न गरी प्रारम्भिक गुणस्तर परीक्षण भईरहेको ।
- ✓ आ.व.२०८१/०८२ को सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने कार्य तोकिए बमोजिम सम्पन्न गरेको र स्थायी कर्मचारीहरूको का.स.मु. फाराम मूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न गरेको ।
- ✓ आ.व.२०८२/०८३ को वार्षिक राजस्व लक्ष्य (रु.७०,००,०००।-)को तुलनामा बढी राजस्व रकम (रु.७६,९४,०२४.३३।-) संकलन भएको ।
- ✓ सुनौलो हजार दिनका विपन्न महिलाको पोषण सुधारका लागि २८ जना गर्भवती महिलालाई आयआर्जन अनुदान कार्यक्रम ।
- ✓ नेपाली सेनासँगको समन्वयमा वडा नं. ५ नेटामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ५१५ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको ।
- ✓ ७ वटै वडामा सरुवा र नसर्ने रोग तथा वडा नं. ५ र ७ मा महिला स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन ।
- ✓ मिति २०८२।०६।०५ गते देखि २०८२।०६।२४ सम्म गाउँपालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता तथा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ।



क्रमशः



- ✓ आगन्तुक पुस्तिका राखी सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको पहिचान सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गरिएको।
- ✓ स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (Local Emergency Operation Center - LEOC) स्थापना गरिएको।
- ✓ कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन प्रणाली मार्फत उजुरी/गुनासो दर्ता गरेको।
- ✓ ReAL Plan तथा द्रुत सिकाइ योजना कार्यान्वयन।
- ✓ कृषकका लागि जैविक विषादी, मिनिकीट र च्याउको विउ वितरण।
- ✓ उत्कृष्ट तथा व्यवसायिक कृषक प्रोत्साहनका लागि कृषि अनुगमन सम्पन्न।
- ✓ २० वटा विद्यालय मर्ज तथा तह घटुवाको काम सम्पन्न भएको।
- ✓ बायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधि मार्फत भूक्षय नियन्त्रण।



न्यायिक कार्यसम्पादनको अवस्था



- ✓ यस आ.व. २०८२/०८३ मा जम्मा ७ वटा उजुरी प्राप्त भएकोमा ३ वटा उजुरीको न्यायिक निरूपण गरिएको ।



अनुगमन र पारदर्शिताको अवस्था:

- ❖ स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम निर्माण कार्यसम्पन्न भएका योजनाहरूको अनुगमन पश्चात भुक्तानी सम्बन्धमा रु.३ लाख वा सो भन्दा कम बजेटका योजनाको भुक्तानी वडास्तरीय अनुगमन समितिको अनुगमन सिफारिस बमोजिम र रु.३ लाख भन्दा माथिका योजनाहरूको भुक्तानी वडा र गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको अनुगमन सिफारिस बमोजिम मात्र भुक्तानी गर्ने गरिएको ।
- ❖ हुंगा, गिट्टी बालुवाको रोयल्टी सम्बन्धी पालिकाले अनुगमन गरेको ।
- ❖ कृषि बिकास शाखाले किसान सूचीकरण सम्बन्धी कार्यको स्थलगत अनुगमन गरेको ।
- ❖ विद्यालय दिवा खाजामा स्थानीय पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी अनुगमन गरेको ।

पारदर्शिताको अवस्था:

- ❖ वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको ।
- ❖ गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सूचना Facebook page र Website मार्फत नियमित सार्वजनिक गर्ने गरेको ।
- ❖ गाउँपालिकाले प्रत्येक ३ महिनाको स्वतः प्रकाशन Website मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको ।
- ❖ सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक परीक्षण मार्फत पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन ।



अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्य



- नेपाली सेनासँगको समन्वयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी ५१५ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको ।
- संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त तथा समानीकरण अनुदान स्वीकृत वार्षिक योजना अनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको ।
- जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूसँग योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गरिएको ।
- संघ तथा प्रदेश स्तरीय तालिम, गोष्ठी, बैठक तथा समीक्षा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता ।
- संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय/निकायसँग आवश्यक पत्राचार तथा समन्वय तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न ।



ऐन तथा कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था:

विवरण	संख्या
ऐन	१०
नियमावली	५
कार्यविधि	३८
निर्देशिका र अन्य	९
जम्मा	६२

- ❖ स्थानीय आवश्यकता तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण/संशोधन ।
- ❖ स्वीकृत ऐन तथा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइएको ।
- ❖ आवश्यकताअनुसार कार्यविधि तथा कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा एवं परिमार्जन गर्ने गरिएको ।



नवीनतम अभ्यास र उदाहरणीय कार्यः



- घुम्टी योजना सम्झौता शिविर मार्फत सबै वडामा योजना सम्झौता गर्ने व्यवस्था ।
- ७ वटै वडाका खानेपानी मुहान तथा धाराको पानी संकलन गरी पालिका स्तरमा खानेपानी गुणस्तर परीक्षण शिविर सञ्चालन (७३ वटा खानेपानी उ.स. को मुहानको पानी परीक्षण) गरी स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चितता गरिएको ।
- “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत पहिलो पटक उत्कृष्ट काम गर्ने ११ जना श्रमिकहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको ।
- टिमु खेतीबाट वार्षिक रु. ४ करोड भन्दा बढी तथा बौधि चित्त बाट रु. १ करोड भन्दा बढीको कारोबार/निर्यात हुँदै स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान ।
- कुमाख गाउँपालिकाका गुफामा विशेषज्ञ टोलीको अध्ययन (चमेरो विज्ञ तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयका निर्देशक डा. पुष्पराज आचार्य, सर्प तथा सर्पदंश विज्ञ डा. देवप्रसाद पाण्डे तथा क्रोएसियाली गुफा पारिस्थितिक विज्ञ डा. दुशान जेलिक सहभागी)
- सिमित स्रोत साधनका बिच पनि घाइते वन्यजन्तुको उद्धार तथा प्राथमिक उपचार गर्ने गरिएको (डा.बिष्णु के.सी. बाट) ।
- वायु प्रदूषण न्यूनीकरण तथा त्यसबाट बच्ने उपाय र ४० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको बिक्री तथा वितरणमा प्रतिबन्ध सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको ।



आ.व. २०८२/०८३ को आन्तरिक लेखा परीक्षण, म.ले.प भए/नभएको:



- आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) - भएको
- अन्तिम लेखा परीक्षण (म.ले.प.बाट हुने क्रममा रहेको) ।



कठिनाई / चुनौतीहरू



- ✓ भौगोलिक विकटता, प्राविधिक जनशक्तिमा दक्षता तथा आवश्यक समन्वयको कमी ।
- ✓ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बीच समन्वयको कमी, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति तथा कार्यसम्पादनमा उत्प्रेरणाको कमी।
- ✓ सीमित बजेट तथा असारमुखी खर्च प्रणालीका कारण लक्षित कार्यक्रम तथा योजना समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाई र एकै समयमा धेरै योजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने हतारो अबस्थाले योजनाको गुणस्तर र विश्वसनीयता मा चुनौती ।
- ✓ शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्दै विद्यार्थी टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने कार्यमा चुनौती ।
- ✓ बजार अनुगमनको कमी तथा व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति ।
- ✓ केही कार्यालय/संस्थामा कमजोर इन्टरनेट पूर्वाधारका कारण अनलाइन सेवा तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा कठिनाई ।
- ✓ योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला तथा आवश्यक पूर्वाधारको अभाव ।
- ✓ योजना तथा सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको प्रभाव, लापरबाही तथा अपनत्व र जिम्मेवारीबोधको कमी ।



आ.व. २०८३/०८४ को योजना तथा कार्यक्रमः

कुमाख गाउँपालिका २०८३।०८४ को विनियोजित बजेट (आय तर्फ)

क्र. स.	राजस्व शीर्षक तथा अनुदानको प्रकार	बजेट रु	अक्षरमा
१	सामानीकरण अनुदान संघीय सरकार	९,९०,००,०००	नौ करोड नब्बे लाख रुपैयाँ मात्र
२	राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार	१०,३५,०२,०००	दस करोड पैँतिस लाख दुई हजार रुपैयाँ मात्र
३	सशर्त अनुदान संघीय सरकार(पूँजीगत)	१,१२,००,०००	एक करोड बाह्र लाख रुपैयाँ मात्र
४	सशर्त अनुदान संघीय सरकार (चालु)	२२,१५,००,०००	बाइस करोड पन्ध्र लाख रुपैयाँ
५	समपुरक अनुदान संघीय सरकार	१,५८,००,०००	एक करोड अन्ठाउन्न लाख रुपैयाँ मात्र
६	विशेष अनुदान संघीय सरकार	४५,००,०००	पैँतालिस लाख रुपैयाँ मात्र
७	सामानीकरण अनुदान प्रदेश सरकार	१,३१,११,०००	एक करोड एकतिस लाख एघार हजार रुपैयाँ मात्र
८	राजस्व बाँडफाँड प्रदेश सरकार	१८१५७०४.८	अठार लाख पन्ध्र हजार सात सय चार रुपैयाँ पैँसा असि मात्र



आ.व. २०८३/०८४ को योजना तथा कार्यक्रम



९	सशर्त अनुदान प्रदेश सरकार (चालु)	२३,३०,०००	तेइस लाख तीस हजार रुपैयाँ मात्र
१०	सशर्त अनुदान प्रदेश सरकार (पूँजीगत)	१,३५,००,०००	एक करोड पैँतिस लाख रुपैयाँ मात्र
११	समपुरक अनुदान प्रदेश सरकार	६०,००,०००	साठि लाख रुपैयाँ मात्र
१२	विशेष अनुदान प्रदेश सरकार (चालु)	५५,००,०००	पचपन्न लाख रुपैयाँ रुपैयाँ मात्र
१३	गाउँपालिकाको आन्तरिक राजश्व अनुमानित	१,००,००,०००	एक करोड रुपैयाँ मात्र
१४	गत आ. व. को अल्या (बैंक मौज्दात) अनुमानित	३,१९,९६,३४०.२	तीन करोड उन्नाइस लाख छयानब्बे हजार तीन सय चालिस रुपैयाँ पैँसा बिस मात्र
जम्मा रु.		५३,९७,५५,०४५.०	त्रिपन्न करोड सन्तानब्बे लाख पचपन्न हजार पैँतालिस रुपैयाँ मात्र



आ.व. २०८३/०८४ को योजना तथा कार्यक्रम

कुमाख गाउँपालिका २०८३।०८४ को विनियोजित बजेट (व्यय तर्फ)



क्र.सं.	गाउँपालिका तर्फ	रकम रु.	अक्षरेपि
१	विभिन्न योजना, कार्यक्रम, पारिश्रमिक तथा कार्यालय संचालन	१३,८२,००,०००	तेह करोड बयासी लाख रुपैयाँ
२	समपुरक (संघीय सरकार र प्रदेश सरकार)	७९,५०,०००	उनासी लाख पचास हजार रुपैयाँ
३	सुस्वा परियोजना सँग साझेदारी	७६,३८,०४५	छयत्तर लाख अठ्ठतिस लाख पैतालिस रुपैयाँ
४	रेडक्रस (सुधार परियोजना) सँग साझेदारी	४०,००,०००	चालिस लाख रुपैयाँ
५	मर्मत सम्भार खर्च	२०,००,०००	विस लाख रुपैया
६	विगत आ.व.का अधुरा आयोजना	१,८२,००,०००	एक करोड बयासी लाख रुपैयाँ
जम्मा रकम रु.		१७,७९,८८,०४५	सत्र करोड उनासी लाख अठ्ठासी हजार पैतालिस रुपैयाँ



आ.व. २०८३/०८४ को योजना तथा कार्यक्रम



क्र.सं	शाखा उपशाखा सेवा केन्द्र	बजेट रकम रु.	अक्षरेपी
१	शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा तर्फ	४८,३०,०००	अठ्चालिस लाख तिस हजार रुपैया
२	स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा तर्फ	१,११,८०,०००	एक करोड अठार लाख रुपैया
३	कृषि विकास शाखा तर्फ	२८,५०,०००	अठ्ठाइस लाख पचास हजार रुपैया
४	पशु विकास शाखा तर्फ	२५,५०,०००	पच्चीस लाख पचास हजार रुपैया
५	प्रशासन, योजना अनुगमन राजस्व र सूचना प्रविधि शाखा तर्फ	३५,५०,०००	पैंतिस लाख पचास हजार रुपैया
६	सामाजिक सुरक्षा तथा पंजिकरण उपशाखा तर्फ	१२,००,०००	बाह्र लाख रुपैया
७	महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण उपशाखा	१४,५०,०००	चौध लाख पचास हजार रुपैया
८	पूर्वाधार विकास शाखा तर्फ	११,००,०००	एघार लाख रुपैया
९	वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा तर्फ	२९,००,०००	उनान्तिस लाख रुपैया



आ.व. २०८३/०८४ को योजना तथा कार्यक्रम

१०	न्यायिक समिति तर्फ	५०,०००	पचास हजार रुपैया
११	बहुक्षेत्रीय पोषण इकाई तर्फ	१,६०,०००	एक लाख साठी हजार रुपैया
१२	उद्यम विकास इकाई तर्फ	४,००,०००	चार लाख रुपैया
१३	रोजगार सिप तथा उद्यमशिलता तर्फ	१३,४७,०००	तेह लाख सरचालिस हजार रुपैया
१४	आयुर्वेद सेवा केन्द्र तर्फ	८,००,०००	आठ लाख रुपैया
१५	भुमी सेवा केन्द्र तर्फ	७,००,०००	सात लाख रुपैया
१६	सहकारी इकाई तर्फ	३,५०,०००	तीन लाख पचास हजार रुपैया
	जम्मा रु.	३,५४,१७,०००	तीन करोड चौवन्न लाख सत्र हजार रुपैया

क्र.सं	वडा नं.	बजेट रकम रु.	अक्षरेपि
१	कुमाख गाउँपालिका वडा नं. १	६८,००,०००	अठसठ्ठी लाख रुपैया
२	कुमाख गाउँपालिका वडा नं. २	६८,००,०००	अठसठ्ठी लाख रुपैया
३	कुमाख गाउँपालिका वडा नं. ३	६८,००,०००	अठसठ्ठी लाख रुपैया
४	कुमाख गाउँपालिका वडा नं. ४	६८,००,०००	अठसठ्ठी लाख रुपैया
५	कुमाख गाउँपालिका वडा नं. ५	६८,००,०००	अठसठ्ठी लाख रुपैया
६	कुमाख गाउँपालिका वडा नं. ६	६८,००,०००	अठसठ्ठी लाख रुपैया
७	कुमाख गाउँपालिका वडा नं. ७	६८,००,०००	अठसठ्ठी लाख रुपैया
	जम्मा बजेट रकम रु.	४,७६,००,०००	चार करोड छयहत्तर लाख रुपैया



आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पन्न आयोजनाहरूको केहि प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु



बेलटाकुरा चौतारी निर्माण



श्री प्रचलित स्मृति आ.वि. खोरेखोला भवन निर्माण



प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु



कुमाख-३, सेरीपाटा देखि गुरुदासे सम्म सिँढी तथा रेलिङ्ग निर्माण



आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पन्न योजनाको प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु



खाक्रेनेटी हुँदै सेरीपाटा भर्ने सडक स्तरोन्नती



प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु



कुमाख-३, राम्री दलित टोलमा सिंचाई ट्याङ्की निर्माण



प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु



कुमाख वडा नं.१ र ४ जोड्ने मर्मखोला पक्की पुल निर्माण



आ.व. २०८२/०८३ मा सम्पन्न योजनाको प्रतिनिधिमूलक तस्विरहरु



कुमाख-२, नेटा बजार मालिका मन्दिर
जाने पदमार्ग निर्माण



जलजले खानेपानी योजनाको Reserve Tank



vivo V60 |



कुमाख-५, त्वाल्द्वारीको जलजले खानेपानी योजना

23mm f/1.88 1/774s ISO50
06/16/2026, 09:47



कुमाख-४ बस्नेतज्यूलाको टिकाचौर सिचाई कुलो निर्माण



सल्यानको कुमाखका ११ श्रमिक सम्मानित

पालिकाले नेटा-बाल्ले सडक खण्डमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर इमान्दारीका साथ उत्कृष्ट काम गर्ने श्रमिकलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो ।

असार १७, २०८३ | विप्लव महर्जन



सल्यान कुमाख गाउँपालिकाका गुफामा विशेषज्ञ टोलीको अध्ययन





डा.बिष्णु के.सी.द्वारा घाइते वन्यजन्तुको उद्धार तथा
प्राथमिक उपचार

जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित १२१ घरधुरीको विस्तृत
क्षति आँकलन (DDA) सर्वेक्षण सम्पन्न



धन्यवाद
